

BELGOCAM SA

Proposition de Projet

Forecast Q4 2026 - Volumes et Valeurs

PROPOSITION DE PROJET

William Francis Fohom

Data Analyst | Administrateur National de Ventes

27 août 2026

Document confidentiel — Diffusion restreinte au comité de direction

1. Contexte et justification

BELGOCAM SA, leader camerounais de la fabrication d'aliments pour bétail, doit anticiper ses volumes de ventes et son chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre 2026 (septembre à décembre). Cette période est stratégique à double titre : elle concentre historiquement la plus forte saisonnalité de l'année (Q4 représente 35 à 46% du volume annuel selon les familles de produits), et elle intervient dans un contexte marqué par une situation critique du stock soja (rupture probable au 16/09/2026 au rythme actuel de consommation) et une hausse tarifaire cumulée de +3 000 FCFA/sac depuis juillet 2026.

L'absence d'un forecast fiable expose l'entreprise à trois risques majeurs : (1) rupture d'approvisionnement soja non anticipée, impactant directement les ventes et le CA ; (2) objectifs commerciaux mal calibrés, conduisant à une sous-performance ou à une surallocation des ressources ; (3) décisions stratégiques prises sur la base d'extrapolations linéaires ne tenant pas compte de la saisonnalité et des effets prix.

Ce projet vise à combler ce besoin en produisant un forecast désagrégé (produit × agence × mois) pour les 4 mois à venir, en volumes et en valeurs, selon une méthodologie rigoureuse (PACE) et un modèle prédictif éprouvé (Prophet). Le forecast couvre 6 familles de produits (TOURTEAUX, CONCENTRÉS, INGRÉDIENTS, ALIMENT COMPLET, MATERIEL ÉLEVAGE incluant les alvéoles, et PREMIX), soit 69 références produits, et exclut le Maïs (produit opportuniste hors portefeuille).

2. Objectifs du projet

Objectif principal

Produire un forecast des volumes de ventes et du chiffre d'affaires pour la période septembre - décembre 2026, désagrégé par produit, famille, agence et région, en tenant compte de la situation critique du stock soja. Le forecast couvre 6 familles (TOURTEAUX, CONCENTRÉS, INGRÉDIENTS, ALIMENT COMPLET, MATERIEL ÉLEVAGE, PREMIX) et exclut le Maïs et les produits opportunistes.

Objectifs spécifiques

- Modéliser la tendance et la saisonnalité mensuelles des ventes par famille × région via Prophet (TOURTEAUX, CONCENTRÉS, INGRÉDIENTS, ALIMENT COMPLET) et extrapolation (MATERIEL ÉLEVAGE, PREMIX)
- Désagréger le forecast au niveau produit × agence en utilisant les parts historiques
- Modéliser le scénario S3 (réappro 100% soja) comme scénario de référence, en tenant compte de la situation critique du stock
- Calculer le CA projeté en appliquant les prix moyens actuels (Option A: extrapolation à partir du CA historique)
- Intégrer le matériel d'élevage (alvéoles, abreuvoirs, mangeoires, etc.) et les prémix en valeurs (CA uniquement)
- Exclure le Maïs et les produits opportunistes (ELVOR TONIC, CARBONATE DE CALCIUM) du périmètre
- Produire les livrables PACE complets (guide méthodologique, stratégie, RACI, résumé exécutif, Excel, notebook)
- Fournir une base de planification commerciale pour les objectifs Q4 2026

3. Périmètre

Périmètre inclus

Dimension	Détail	Volume
Période forecast	Septembre - Décembre 2026 (4 mois)	4 mois
Familles incluses	TOURTEAUX, CONCENTRÉS, INGRÉDIENTS, ALIMENT COMPLET, MATERIEL ÉLEVAGE (alvéoles inclus), PREMIX	6 familles
Produits	69 références (T102, C101-C108, MAT014/MAT011/MAT017 alvéoles, P102N2, etc.)	69 produits
Agences	14 agences BELGOCAM (FAMLA, NDOBO, DJELENG, etc.)	14 agences
Régions	Ouest, Centre, Littoral	3 régions
Niveau détail	Produit × Agence × Mois	7 224 lignes
Scénario retenu	S3 - Réappro 100% (80 000 sacs au 15/09/2026)	1 scénario
Sorties	Volume (tonnes) + Valeur (M FCFA)	2 dimensions

Périmètre exclu

Exclusions structurelles (entités et clients internes)

- Ventes des entités internes (SPC, PDC, Comptoir) — exclues pour éviter les doubles comptes
- Agences SPC/PDC (Baf-Chefferie, Emana, Ndere, Dschang, Buea-SPC, Yassa) — non commerciales
- Clients internes (CLIENTS COMPTOIR MESSASSI, AHALA, etc.) — ventes comptoir non significatives
- Catégories DIVERS (manuels, pierre à lécher), DIVERS2 (contribution carburant, pont bascule, sac réemploi), COMPLEMENT ALIMENTAIRE (BELGOKILL, BELGO HARMONY, etc.) — hors périmètre

Produits opportunistes exclus du portefeuille régulier

- MAÏS (M1051, M1052) — Produit opportuniste ne figurant pas dans le portefeuille régulier BELGOCAM. Exclu du forecast Q4 et des analyses futures.
- ELVOR TONIC — Produit opportuniste (si vendu). À exclure systématiquement des futures analyses.
- CARBONATE DE CALCIUM — Produit opportuniste (si vendu). À exclure systématiquement des futures analyses.

Note : Ces exclusions opportunistes seront appliquées systématiquement dans toutes les analyses futures (zero achat, bundle soja-concentrés, suivi mensuel, etc.) pour éviter de biaiser les performances avec des produits non récurrents hors portefeuille.

4. Méthodologie PACE

La méthodologie PACE (Prepare-Analyze-Construct-Execute) structure le projet en 4 phases successives, chacune avec des livrables et points de contrôle spécifiques. Cette approche garantit la reproductibilité, la traçabilité et la qualité du forecast.

BELGOCAM - Méthodologie PACE pour le Forecast Q4 2026

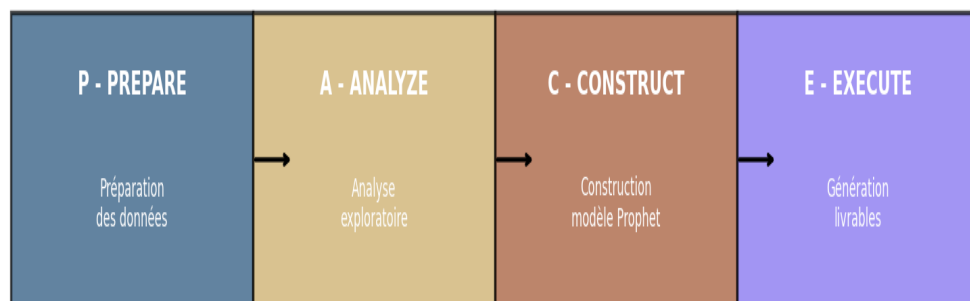


Figure 1 - Méthodologie PACE pour le forecast Q4 2026

Phase	Activités	Livrables	Durée
P - PREPARE	Chargement données, nettoyage, consolidation, calcul prix, intégration matériel élevage + premix	Dataset consolidé (115 592 records), Prix par produit	2 jours
A - ANALYZE	AED, statistiques descriptives, saisonnalité, top produits/agences	Graphiques AED (6), Synthèse statistique	1 jour
C - CONSTRUCT	Modélisation Prophet (4 familles alimentaires) + extrapolation (matériel + premix), scénario S3, désagrégation	Forecast Q4 (7 224 lignes), Modèles validés	2 jours
E - EXECUTE	Génération livrables finaux (Excel, PDFs, notebook)	9 livrables finaux	1 jour

5. Équipe projet et gouvernance

Bien que l'équipe d'analyse soit composée d'une seule personne (Data Analyst), le projet mobilise plusieurs rôles fonctionnels au sein de BELGOCAM. La matrice RACI détaillée (voir livrable séparé) définit les responsabilités de chacun à chaque étape du projet.

Rôle	Responsabilité principale	Phase PACE
Data Analyst (W. F. Fohom)	Modélisation, AED, forecast, livrables techniques	P + A + C + E
Direction Commerciale	Validation hypothèses commerciales et objectifs	A + E (validation)
Direction Production	Informations stock, capacité production, réappro	P + C (input)
Direction Générale	Décisions stratégiques, allocation ressources	E (décision)
Contrôle de Gestion	Validation CA projeté et cohérence financière	E (validation)

6. Risques et mitigation

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Rupture soja non anticipée	Élevée	Critique	4 scénarios modélisés, alerte 16/09
Hausse prix Q4 non prévue	Moyenne	Moyen	Scénario S4 (baisse) en complément
Données historiques insuffisantes	Moyenne	Moyen	20 mois de données (2025-S1 2026)
Effet prix sur demande non quantifié	Élevée	Moyen	Option A: prix stable Q4 (validée)
Saisonnalité Q4 mal captée	Faible	Moyen	Prophet yearly seasonality activée
Désagrégation produit x agence biaisée	Faible	Faible	Parts historiques 2025-S1 2026

7. Planning et jalons

Jalon	Date prévue	Livrable
Kick-off et validation périmètre	J+0 (27/08/2026)	Proposition de projet validée
Phase PREPARE terminée	J+2 (29/08/2026)	Dataset consolidé + prix calculés
Phase ANALYZE terminée	J+3 (30/08/2026)	AED et graphiques
Phase CONSTRUCT terminée	J+5 (01/09/2026)	Forecast Q4 (4 scénarios)
Phase EXECUTE - Livrables finaux	J+6 (02/09/2026)	Excel + PDFs + notebook
Présentation comité de direction	J+7 (03/09/2026)	Validation officielle
Mise à jour mensuelle	Mensuel	Réactualisation avec nouvelles données

8. Budget et ressources

Le projet ne nécessite pas de budget supplémentaire : il utilise les ressources informatiques existantes (ordinateur portable, Python, Jupyter, Prophet) et les données ERP déjà disponibles. L'investissement principal est le temps du Data Analyst (6 jours-homme) et la sollicitation des directions métiers pour la validation des hypothèses (Direction Commerciale, Direction Production, Contrôle de Gestion).

9. Critères de succès

- Forecast produit pour le scénario S3 avec désagrégation complète (produit x agence x mois)
- Couverture de 6 familles et 69 produits (incluant matériel d'élevage/alvéoles et premix)
- Exclusion effective du Maïs et des produits opportunistes (ELVOR TONIC, CARBONATE DE CALCIUM)
- Écart forecast vs réalité $\leq 15\%$ à fin septembre (premier mois prédictible)
- Validation des hypothèses par la Direction Commerciale et le Contrôle de Gestion
- Livrables PACE complets (9 documents) produits et diffusés
- Réutilisabilité du modèle pour les prochains trimestres (notebook commenté)
